


Projektplan

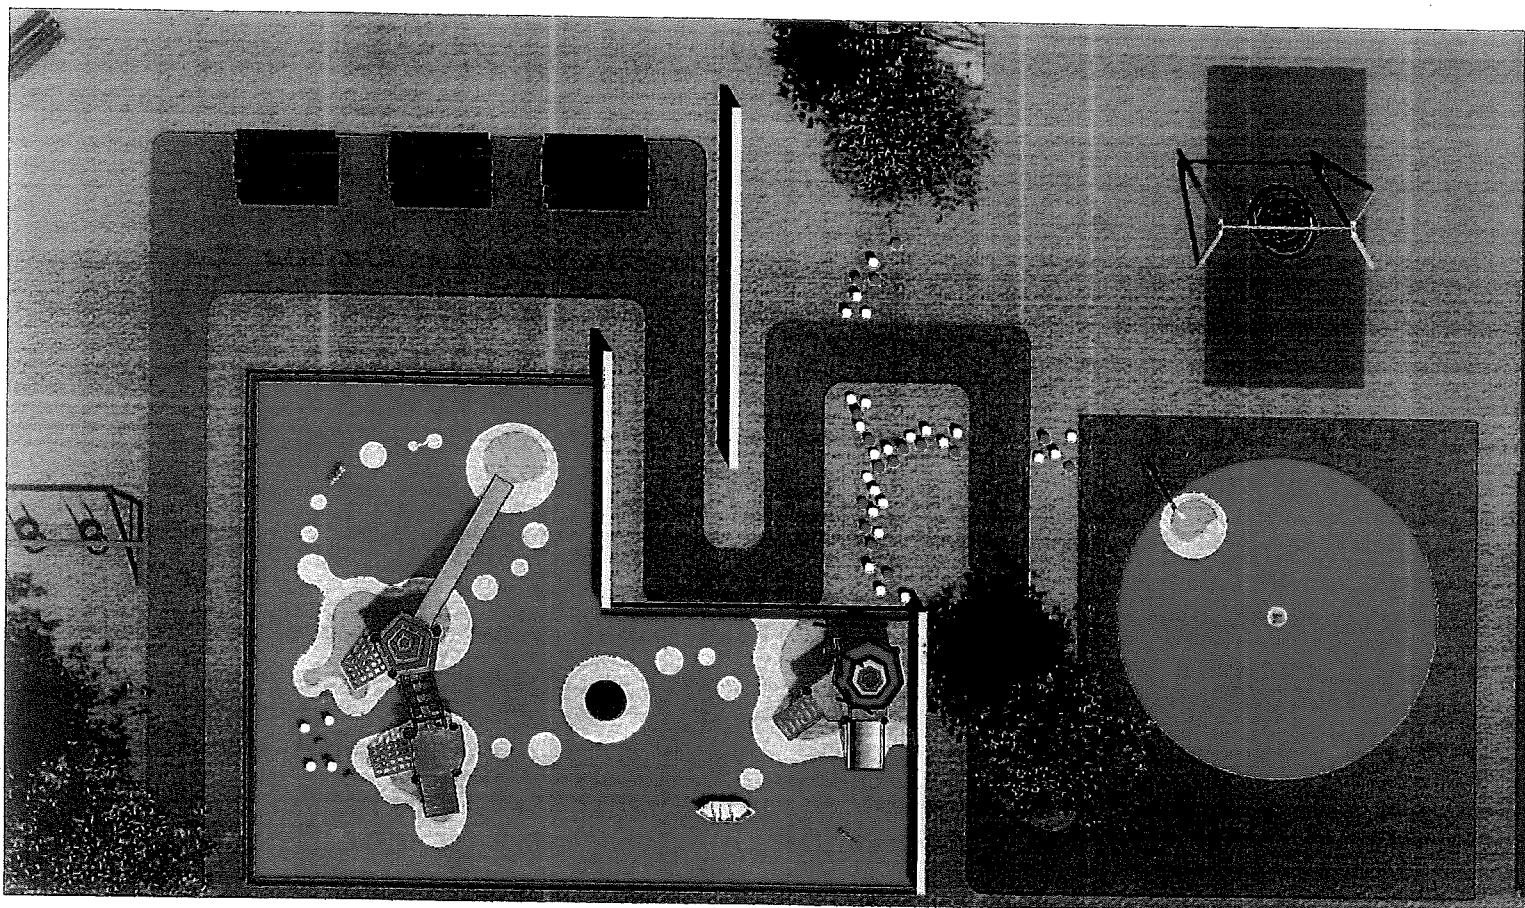

Forventet montageplan

- Forventet montagetid - 2 til 3 uger fra opstart
- Opstart af montage uge 38
- Den 18/9 - 19/9. Losning af 3 lastbiler + klargøring af område til montage
- Eksisterende gyngestativ flyttes
- Udgravning af huller / klargøring til støbning
- Ultimo uge 38 - Selve opsætningen af ny legeplads begynder
- Primo uge 39 - resterende legeredskaber leveres
- Uge 39 - Montage samt klargøring til udlægning af gummi
- Uge 39 / uge 40 - udlægning af gummibelægning
- Uge 40 - Reetablering af område
